LØDINGEN 1-10 SKOLE
HOVEDFREMDRIFTSPLAN
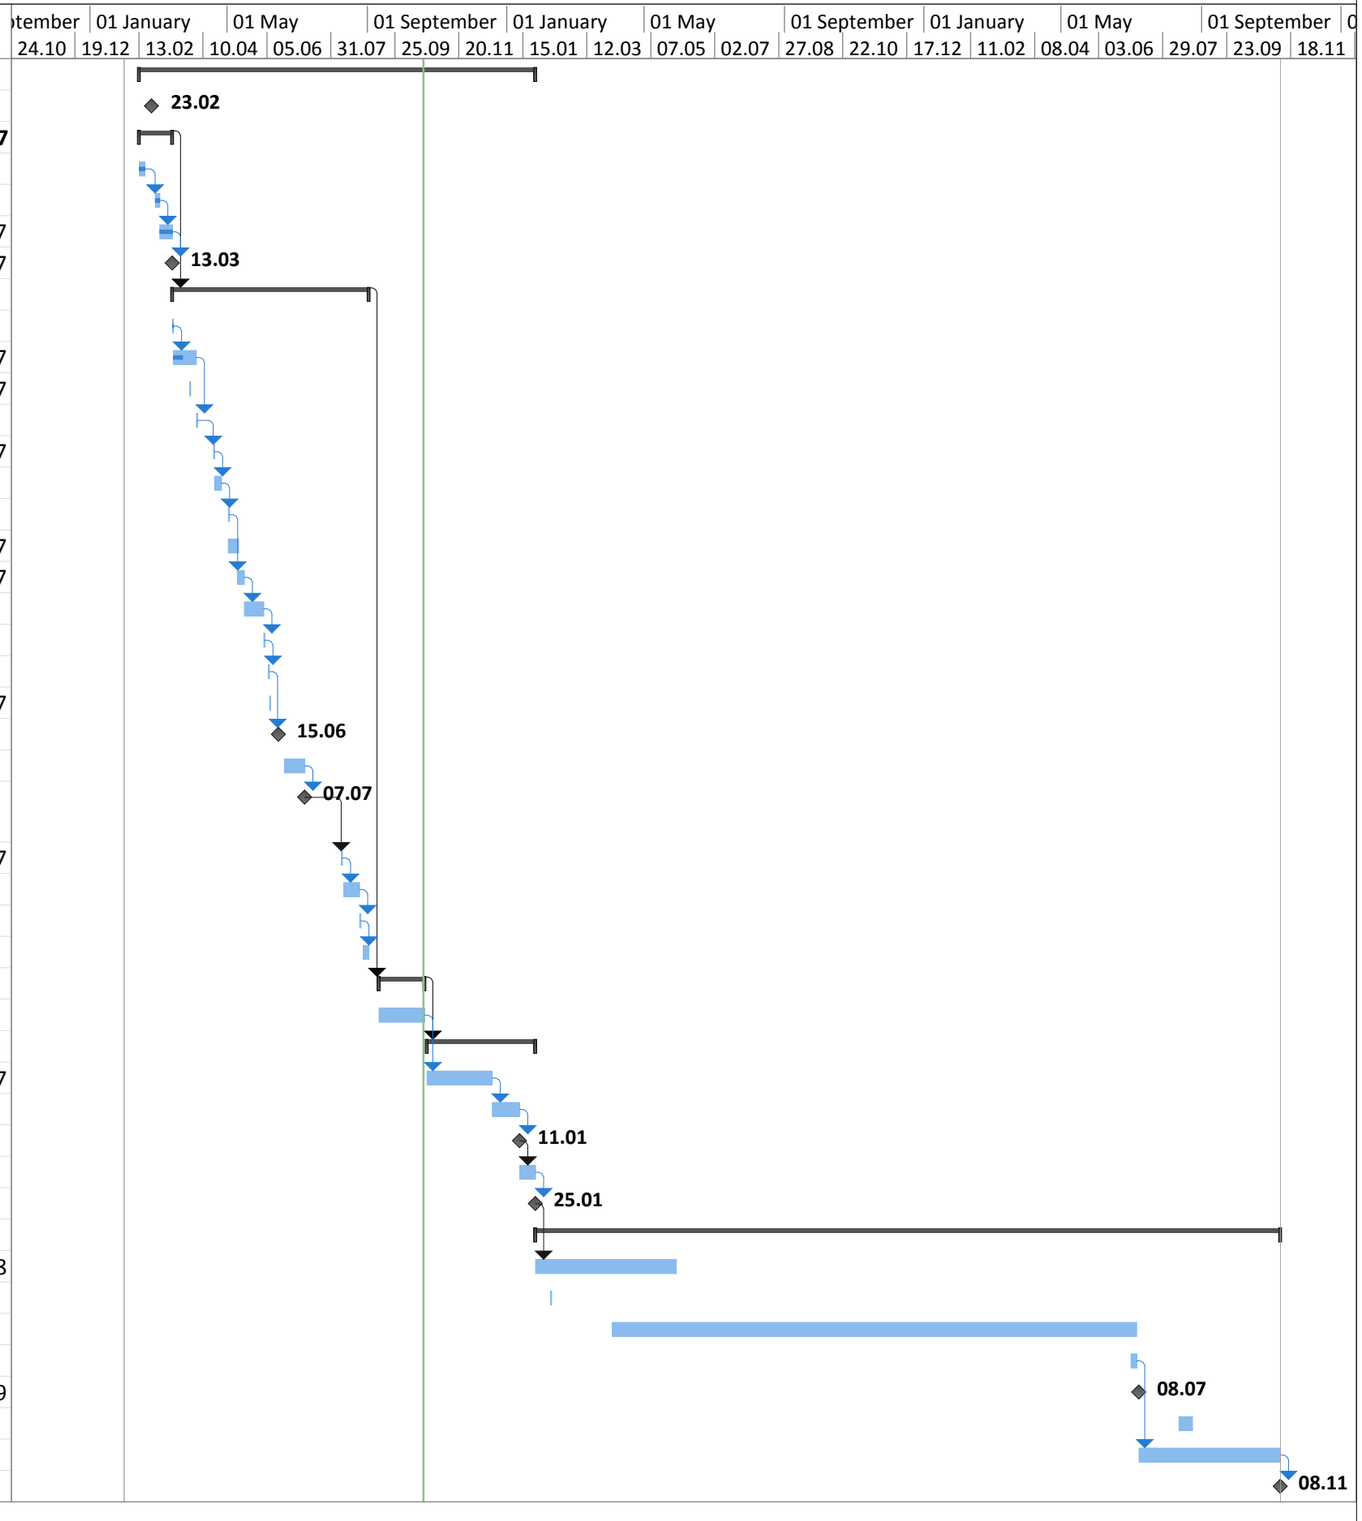
ID	Aktivitetsnavn	Duration	Start	Finish
1	**FORPROSJEKTFASE**	**214 day**	**Mon 13.02.17**	**Thu 25.01.18**
2	Reguleringsplan ferdig behandlet I Lødingen kommune	0 days	Thu 23.02.17	Thu 23.02.17
3	**Gjennomføring av mini konkurranse - anskaffelse av ny ARK**	**21 days**	**Mon 13.02.17**	**Mon 13.03.17**
4	Direkte henv til min 3 arkitekter, utsending av konk.gr.lag	5 days	Mon 13.02.17	Fri 17.02.17
5	Tilbudsfrist, tilbudsåpning, vurdering av innkomne tilbud	4 days	Mon 27.02.17	Thu 02.03.17
6	Innstilling av ARK, utsending av brev, karenstid	7 days	Fri 03.03.17	Mon 13.03.17
7	Kontraktsinngåelse ny ARK (pr. Epost)	0 days	Mon 13.03.17	Mon 13.03.17
8	**Faseplan for kostnadsreduksjoner**	**92 days**	**Tue 14.03.17**	**Fri 01.09.17**
9	Prosjekteringsmøte I Bodø	1 day	Tue 14.03.17	Tue 14.03.17
10	ARK lager nytt forslag der alle tiltak for kutt tas inn	14 days	Wed 15.03.17	Mon 03.04.17
11	Koordineringsmøte med SG I Lødingen	1 day	Wed 29.03.17	Wed 29.03.17
12	Orientering SG/Brukermøte 1 I Lødingen	1 day	Tue 04.04.17	Tue 04.04.17
13	Senest tilbakemelding fra brukere til arkitekt	1 day	Wed 19.04.17	Wed 19.04.17
14	Arkitekt utfører rev. e. brukerm.vrk. (utarb av planløsning C)	4 days	Thu 20.04.17	Tue 25.04.17
15	Brukermøte 2 - presentasjon av planløsning C	1 day	Tue 02.05.17	Tue 02.05.17
16	Ekstra kuttrunde (alternative planløsninger A og B)	7 days	Tue 02.05.17	Wed 10.05.17
17	ARK ferdigstiller plantegninger - overlevering til RI - løsning B	4 days	Wed 10.05.17	Mon 15.05.17
18	RI- prosjektering planløsning B	11 days	Tue 16.05.17	Thu 01.06.17
19	Leveranse forprosjekt for planløsning B	1 day	Fri 02.06.17	Fri 02.06.17
20	Skrivefrist LK	1 day	Tue 06.06.17	Tue 06.06.17
21	Møte I AMU - avklaring av plantegninger	1 day	Wed 07.06.17	Wed 07.06.17
22	Lødingen kommunestyre	0 days	Thu 15.06.17	Thu 15.06.17
23	Arkitekt tegner ut vedtak fra KS (heretter kalt C+)	14 days	Tue 20.06.17	Fri 07.07.17
24	Ny planløsning (C+) overleveres til LK og brukerne for medvirkning	0 days	Fri 07.07.17	Fri 07.07.17
25	Brukermøte på ny planløsning (C+) I Lødingen	1 day?	Wed 09.08.17	Wed 09.08.17
26	ARK innarbeider innspill fra brukerne	10 days	Fri 11.08.17	Thu 24.08.17
27	Låst planløsning. Overlevering til RI *	1 day?	Fri 25.08.17	Fri 25.08.17
28	Modellering RI avklaringer mot ARK	5 days	Mon 28.08.17	Fri 01.09.17
29	**TILBUDSGRUNNLAG FOR TE-KONKURRANSE**	**30 days**	**Mon 11.09.17**	**Fri 20.10.17**
30	Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for TE inkl kvalitetssikring	30 days	Mon 11.09.17	Fri 20.10.17
31	**Tilbudskonkurranse, evaluering, kontrahering**	**66 days**	**Mon 23.10.17**	**Thu 25.01.18**
32	Tilbudsfase totalentreprise	41 days	Mon 23.10.17	Mon 18.12.17
33	Kontroll, evaluering, innstilling til kommunestyret	15 days	Tue 19.12.17	Thu 11.01.18
34	Kommunestyret godkjennelse av øk ramme og finansiering	0 days	Thu 11.01.18	Thu 11.01.18
35	Karensperiode totalentreprise	10 days	Fri 12.01.18	Thu 25.01.18
36	Kontrakt totalentreprenør	0 days	Thu 25.01.18	Thu 25.01.18
37	**BYGGEFASE**	**429 day**	**Fri 26.01.18**	**Fri 08.11.19**
38	TE's detaljprosjektering	80 days	Fri 26.01.18	Mon 28.05.18
39	1. søknad om IGT	1 day	Thu 08.02.18	Thu 08.02.18
40	Byggetid	295 day	Tue 03.04.18	Fri 05.07.19
41	Ferdigstillelse	5 days	Mon 01.07.19	Fri 05.07.19
42	Frist for start prøvedrift	0 days	Mon 08.07.19	Mon 08.07.19
43	Befaringer, gjennomgang bygg/tekniske anlegg	10 days	Mon 12.08.19	Fri 23.08.19
44	Prøvedrift (gjennomføres etter innflytting og ved full drift)	90 days	Mon 08.07.19	Fri 08.11.19
45	Formell overtakelse av 1-10 skole	0 days	Fri 08.11.19	Fri 08.11.19
